
Мурманская область
город Мончегорск,
территория Промплощадка КГМК


«Здание цеха электролизного никеля - корпус №2», инв.№20002, инв.№20019, инв.№25264, инв.№25261

АО «Кольская КГМК»

Объект недвижимости «Здание цеха электролизного никеля корпус № 2»
инв.№20002, инв.№20019, инв.№25264, инв.№25261

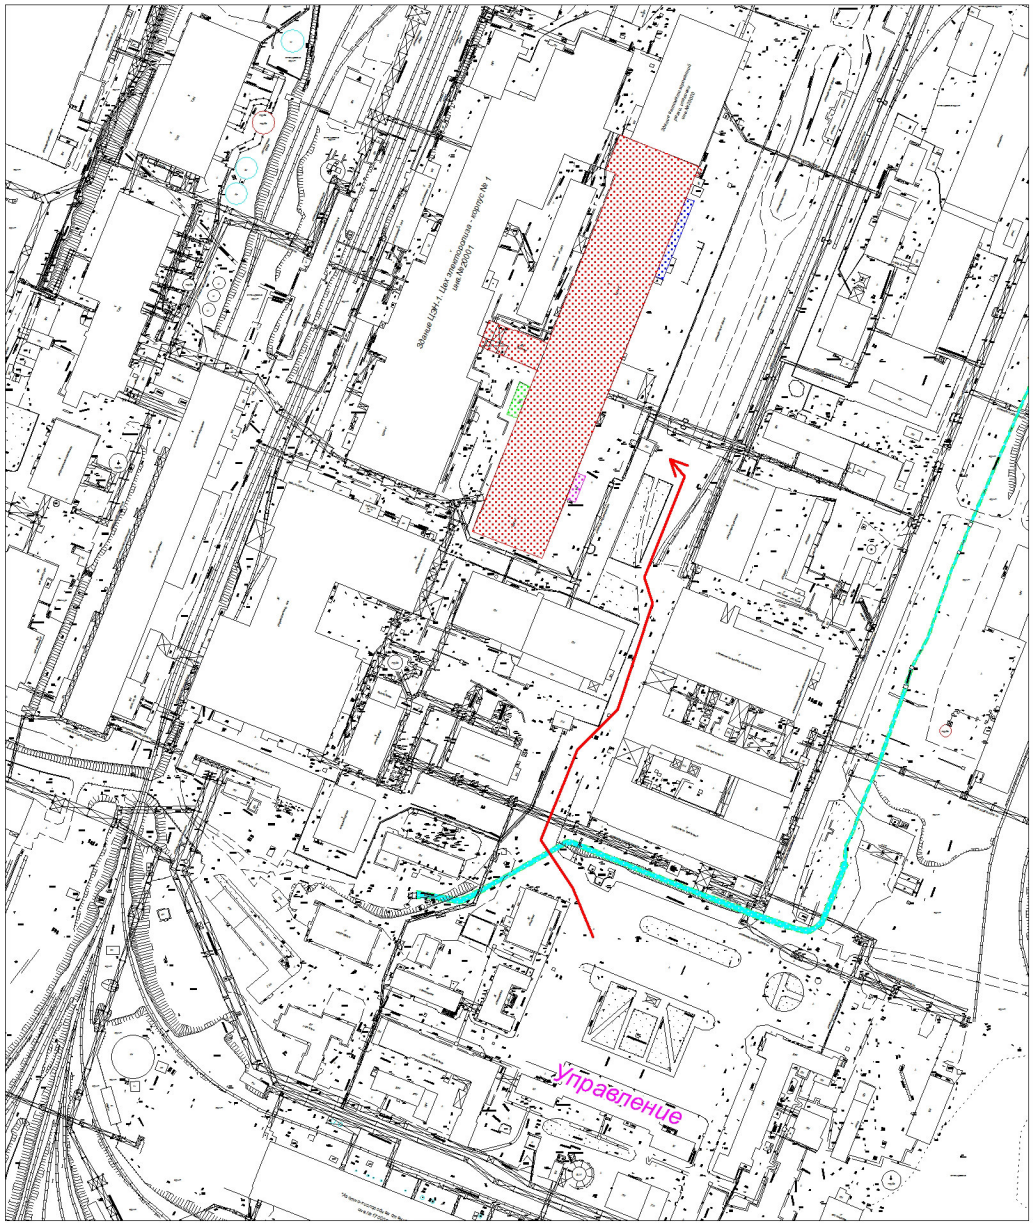

Ситуационная схема расположения объекта

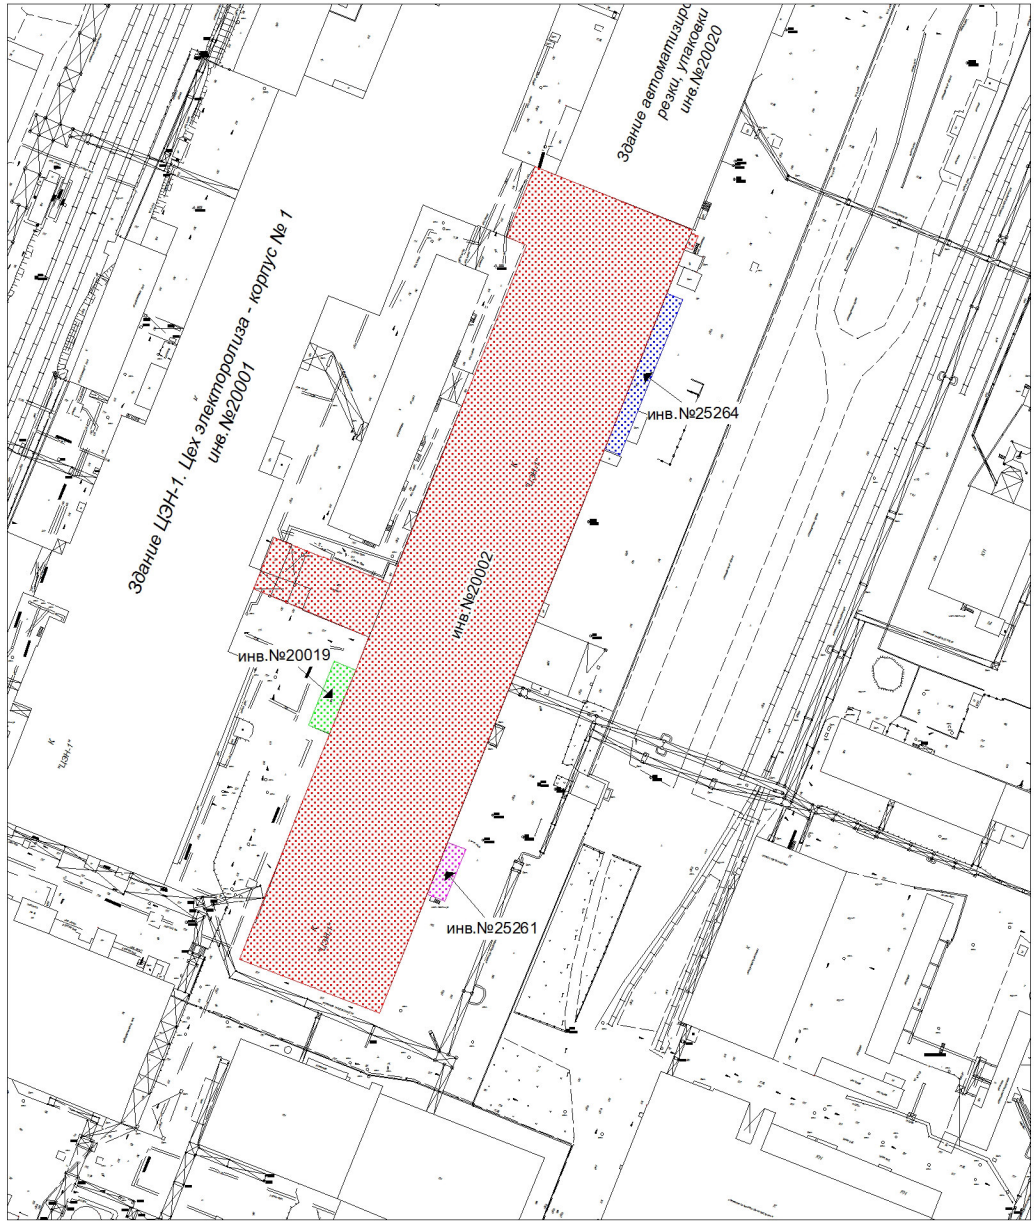

План расположения объекта М 1:3000

ООО "МУРМАНСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НА ЗДАНИЕ

Здание цеха электролизного никеля - корпус № 2
инв.№20002, инв.№20019, инв.№25264, инв.№25261

(назначение нежилого строения)

Район
Город (пос.) Мончегорск
Улица территория Промплощадка ГМК

квартал №
инвентарный №

Составлен по состоянию на "18" сентября 2018г.

I. Сведения о принадлежности объекта

Реестровый номер _____ Фонд: частная собственность-16

Дата записи	Вид права	Субъект права	Доля	Кадастровый номер	Свидетельство о государственной регистрации права
18.09.2018г.	собственность	АО "Кольская ГМК"		51:10:0020803:3459	Серия 51-АВ 290384 от 15.03.2012г.

II. Экспликация земельного участка, кв.м.

Площадь участка			Незастроенная площадь									
по документам	фактически	застроенная										
		14977										

III. Благоустройство полезной площади (кв.м.)

Водопровод	Канализация	Отопление					Ванны			газоснабж.		Электроснабжение	Лифты		Электропоиты стационарные	
		от Мурманская ТЭЦ	от групповой (квартальной)	от АГВ	печное	местная котельная	с централиз. горячим водоснабжением	с газовыми колонками	с дровяными колонками	централи-зованное	жидким газом		пассажирские	грузовые		
31066.4	31066.4	31066.4				31066.4						31066.4				Лит.Б

Площадь для регистрации права 32633.0 кв.м, согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 1 марта 2016 г. № 90 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения"

IV. Общие сведения

Назначение	
Использование	Здание цеха электролизного никеля - корпус № 2
Количество мест (мощность)	

V. Исчисление площадей и объемов зданий и его частей (подвалов, полуподвалов и пристроек)

Литер по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчета площадей по наружнему обмеру	Площадь (кв. м)	Высота (м)	Объем, (куб. м)	
1	2	3	4	5	6	
Б	Здание цеха электролизного никеля - корпус № 2	114.68*36.70	4208.76	20.55	86490	269105
		0.5*114.58*36.70*1.55			3259	
		60.68*12.20	740.30	16.45	12178	
		12.20*54.00	658.80	12.30	8103	
		7.53*21.88	164.76	5.80	956	
		18.43*6.35	117.03	8.20	960	
		49.20*25.32	1245.74	19.30	24043	
		2/3*49.20*25.32*1.55			1287	
		24.70*113.24	2797.02	19.70	55101	
		(12.25*113.24)*2	2774.38	14.15	39257	
		49.20*25.44	1251.65	20.60	25784	
		2/3*49.20*25.44*1.55			1293	
		5.03*2.25	11.32	2.50	28	
		7.12*25.16	179.14	5.50	985	
		5.15*4.80	24.72	2.95	73	
		5.29*55.38	292.96	3.40	996	
		11.10*5.60	62.16	4.75	295	
		54.73*6.65	363.95	3.55	1292	
		23.98*19.03	456.34	6.40	2921	
		12.38*42.09	521.07	7.30	3804	
	колонны	0.42*0.42*8	1.40			
б	крыльцо	5.71*2.61	14.90			

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Б Год постройки 1963 Число этажей 4

Группа капитальности I Вид внутренней отделки простой

№ п.п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки,трещины,гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивного элем. с поправк.	Износ в %	% износа к строению гр.7х гр.8/100	Текущие измен. износ в %	
										элемент	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		железобетонные блоки		10	1	10				
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	кирпичные		23	1	23				
		б. перегородки	кирпичные,гипсолитовые								
3	Перекрытия	чердачные	железобетонные плиты		16	1	16				
		междуэтажные	железобетонные плиты								
		надподвальные									
4	Крыша		бесчердачная мягкая		11	1	11				
5	Полы		бетонные, кирпичные, линолеум, плиточные		18	1	18				
6	проемы	оконные	стеклоблоки, двойные створные		4	1	4				
		дверные	металлические ворота и двери, двери филенчатые								
7	Внутренняя отделка		штукатурка стен, окраска, побелка потолка, облицовка керамической плиткой стен		4	1	4				
8	Санитарно- и электротехнические работы	Отопление	от местной котельной		10	1	10				
		Водопровод	трубы стальные								
		Канализация	трубы чугунные								
		Электроосвещение	проводка открытая, скрытая								
		Радио									
		Телефон	проводка открытая								
		Телевидение									
		Ванны									
		Горячее водоснабжение	трубы стальные								
		Лифты									
		Вентиляция	приточно-вытяжная								
9	Особое		строительные работы		2	1	2				
10	Прочие работы		прочие		2	1	2				
				Итого	100	x	100	x	0.0	x	

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{проц. износа (гр. 9)х100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{\quad}{\quad}$

VII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение износа

Литера _____ Год постройки _____ Число этажей _____

Группа капитальности _____ Вид внутренней отделки _____

№ п.п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки,трещины ,гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивного элем. с поправк.	Износ в %	% износа к строению гр.7х гр.8/100	Текущие измен. износ в %	
										элемент	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент										
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка									
		б. перегородки									
3	Перекрытия	чердачные									
		междуэтажные									
		надподвальные									
4	Крыша										
5	Полы										
6	проемы	оконные									
		дверные									
7	Внутренняя отделка										
8	Санитарно- и электротехнические работы	Отопление									
		Водопровод									
		Канализация									
		Электроосвещение									
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
		Горячее водоснабжение									
		Лифты									
9	Особые										
10	Разные работы										
				Итого	0	x	0	x	0	x	

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{проц. износа (гр. 9)х100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = ____$

VIII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение износа

Литера _____ Год постройки _____ Число этажей _____

Группа капитальности _____ Вид внутренней отделки _____

№ п.п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки,трещины ,гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивного элем. с поправк.	Износ в %	% износа к строению гр.7х гр.8/100	Текущие измен. износ в %	
										элемент	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент										
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка									
		б. перегородки									
3	Перекрытия	чердачные									
		междуэтажные									
		надподвальные									
4	Крыша										
5	Полы										
6	проемы	оконные									
		дверные									
7	Внутренняя отделка										
8	Санитарно- и электротехнические работы	Отопление									
		Водопровод									
		Канализация									
		Электроосвещение									
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
		Горячее водоснабжение									
		Лифты									
9	Разные работы										
				Итого	0	x	0	x	0	x	

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{проц. износа (гр. 9)х100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = _____ 0\%$

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов		Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.	Литера	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.		Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.
Фундамент											
Стены и перегородки											
Перекрытия											
Крыша											
Полы											
Проемы											
Отделочные работы											
Электроосвещение											
Прочие работы											
	Итого	100	x		Итого	100	x	Итого	100	x	

Наименование конструктивных элементов	литера	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.	литера	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.		Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.
Фундаменты											
Стены и перегородки											
Перекрытия											
Крыша											
Полы											
Проемы											
Отделочные работы											
Электроосвещение											
Прочие работы											
	Итого	100	x		Итого	100	x	Итого	100	x	

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэффициенты) на:						Количество, объем, куб. м, площ., кв. м	Восстан. стоимость, руб.	% износа	Действит. стоимость, руб.
						удельн. вес.	на пояс				ст-ть измер.с поправк.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
Б	Здание цеха электролизного никеля - корпус № 2	2	48	м³	14.6	1.00						269105			

XI. Техническое описание служебных построек

Наименование конструктивных элементов	литера ____ Н=	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.	литера ____ Н=	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.	литера ____ Н=	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
	Итого	100	x		Итого	100	x		Итого	100	x	

Наименование конструктивных элементов	литера ____ Н	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.	литера ____ Н	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.	литера ____ Н	Удельн. вес по таблице	ценностный коэф.	Удельн. вес после применения коэф.
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
	Итого	100	x		Итого	100	x		Итого	100	x	

XII. Исчисление стоимости служебных построек

Литера	Наименование строений и построек	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэффициенты) на:						Стоимость измерителя с поправк.	Количество, объем, куб. м, площ., кв. м	Восстан. стоимость, руб.	% износа	Действит. стоимость, руб.
						удельн. вес	климатический район									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

XIII. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Наименование сооружения	Материал и конструкция	Размеры		Площадь, кв. м	№ сборника	№ таблицы	Измерители	Стоимость измерителя по таблице	Поправка на климат. район	Восстанов. стоимость, руб.	% износа	Действит. стоимость, руб.
		длина, м	высота, ширина, м									

XIY. Общая стоимость,руб.

В ценах какого года	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения			
	восстано-вительная	действительная	восстано-вительная	действительная	восстано-вительная	действительная	восстано-вительная	действительная

18 " сентября 2018г.

Исполнил _____ (Обнорская Н.Г.)

18 " сентября 2018г.

Проверил _____ (Каменская Т.А.)

_____

Начальник технического отдела _____ (Третьяк В.Н.)

ООО "Мурманское
землеустроительное предприятие"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1125190012738
"Мурманское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие"
ИНН 5190010980
г.МУРМАНСК

Работа выполнена	"___" _____ _____г.	"___" _____ _____г.	"___" _____ _____г.
Исполнил			
Проверил			
Начальник технического отдела ООО "Мурманское землеустроительное предприятие"			

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Поэтажный план

План 1 этажа




Масштаб 1:200

Составил Обворская Н.Г.
18.09.2018г.
Проверил Каменская Т.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Поэтажный план

План на отметке +2,40, +3,15, +4,20

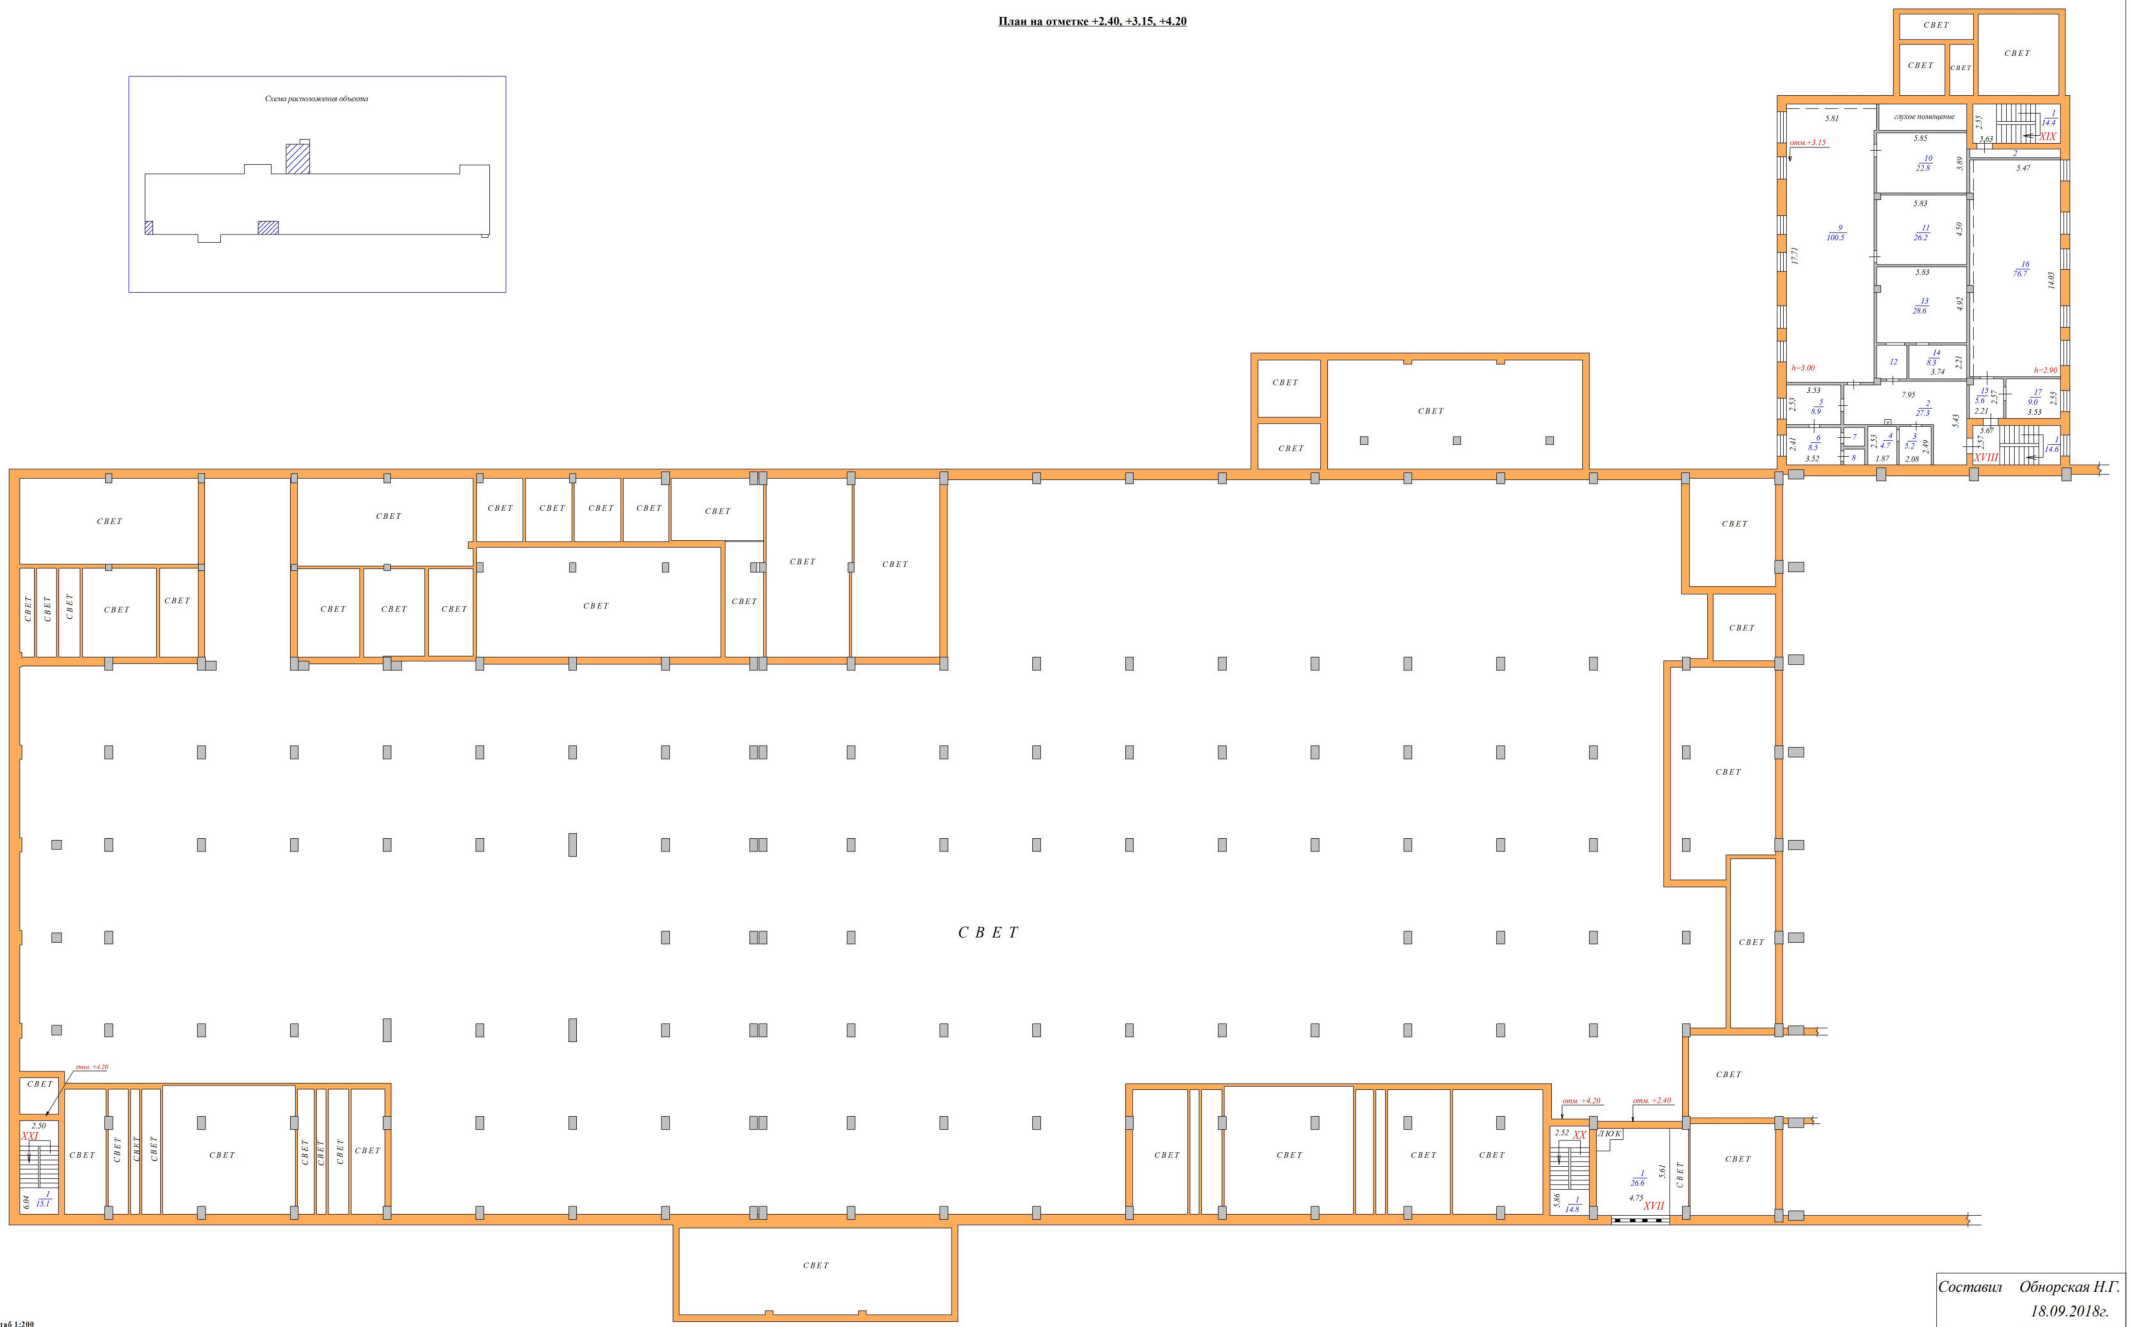

Масштаб 1:200

Составил Обнорская Н.Г.
18.09.2018г.
Проверил Каменская Т.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Поэтажный план

"Монтаж электрического щита - корпус 2" зак.3630001

План 2 этажа

"Монтаж электрического щита - корпус 1" зак.3630001

Монтаж электрического щита, клеммная зак.3630001 зак.4630102 зак.4630103


Масштаб 1:200


Составил	Обворская И.Г.	
	18.09.2018г.	
Проверил	Каменская Т.А.	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Поэтажный план

План 3 этажа



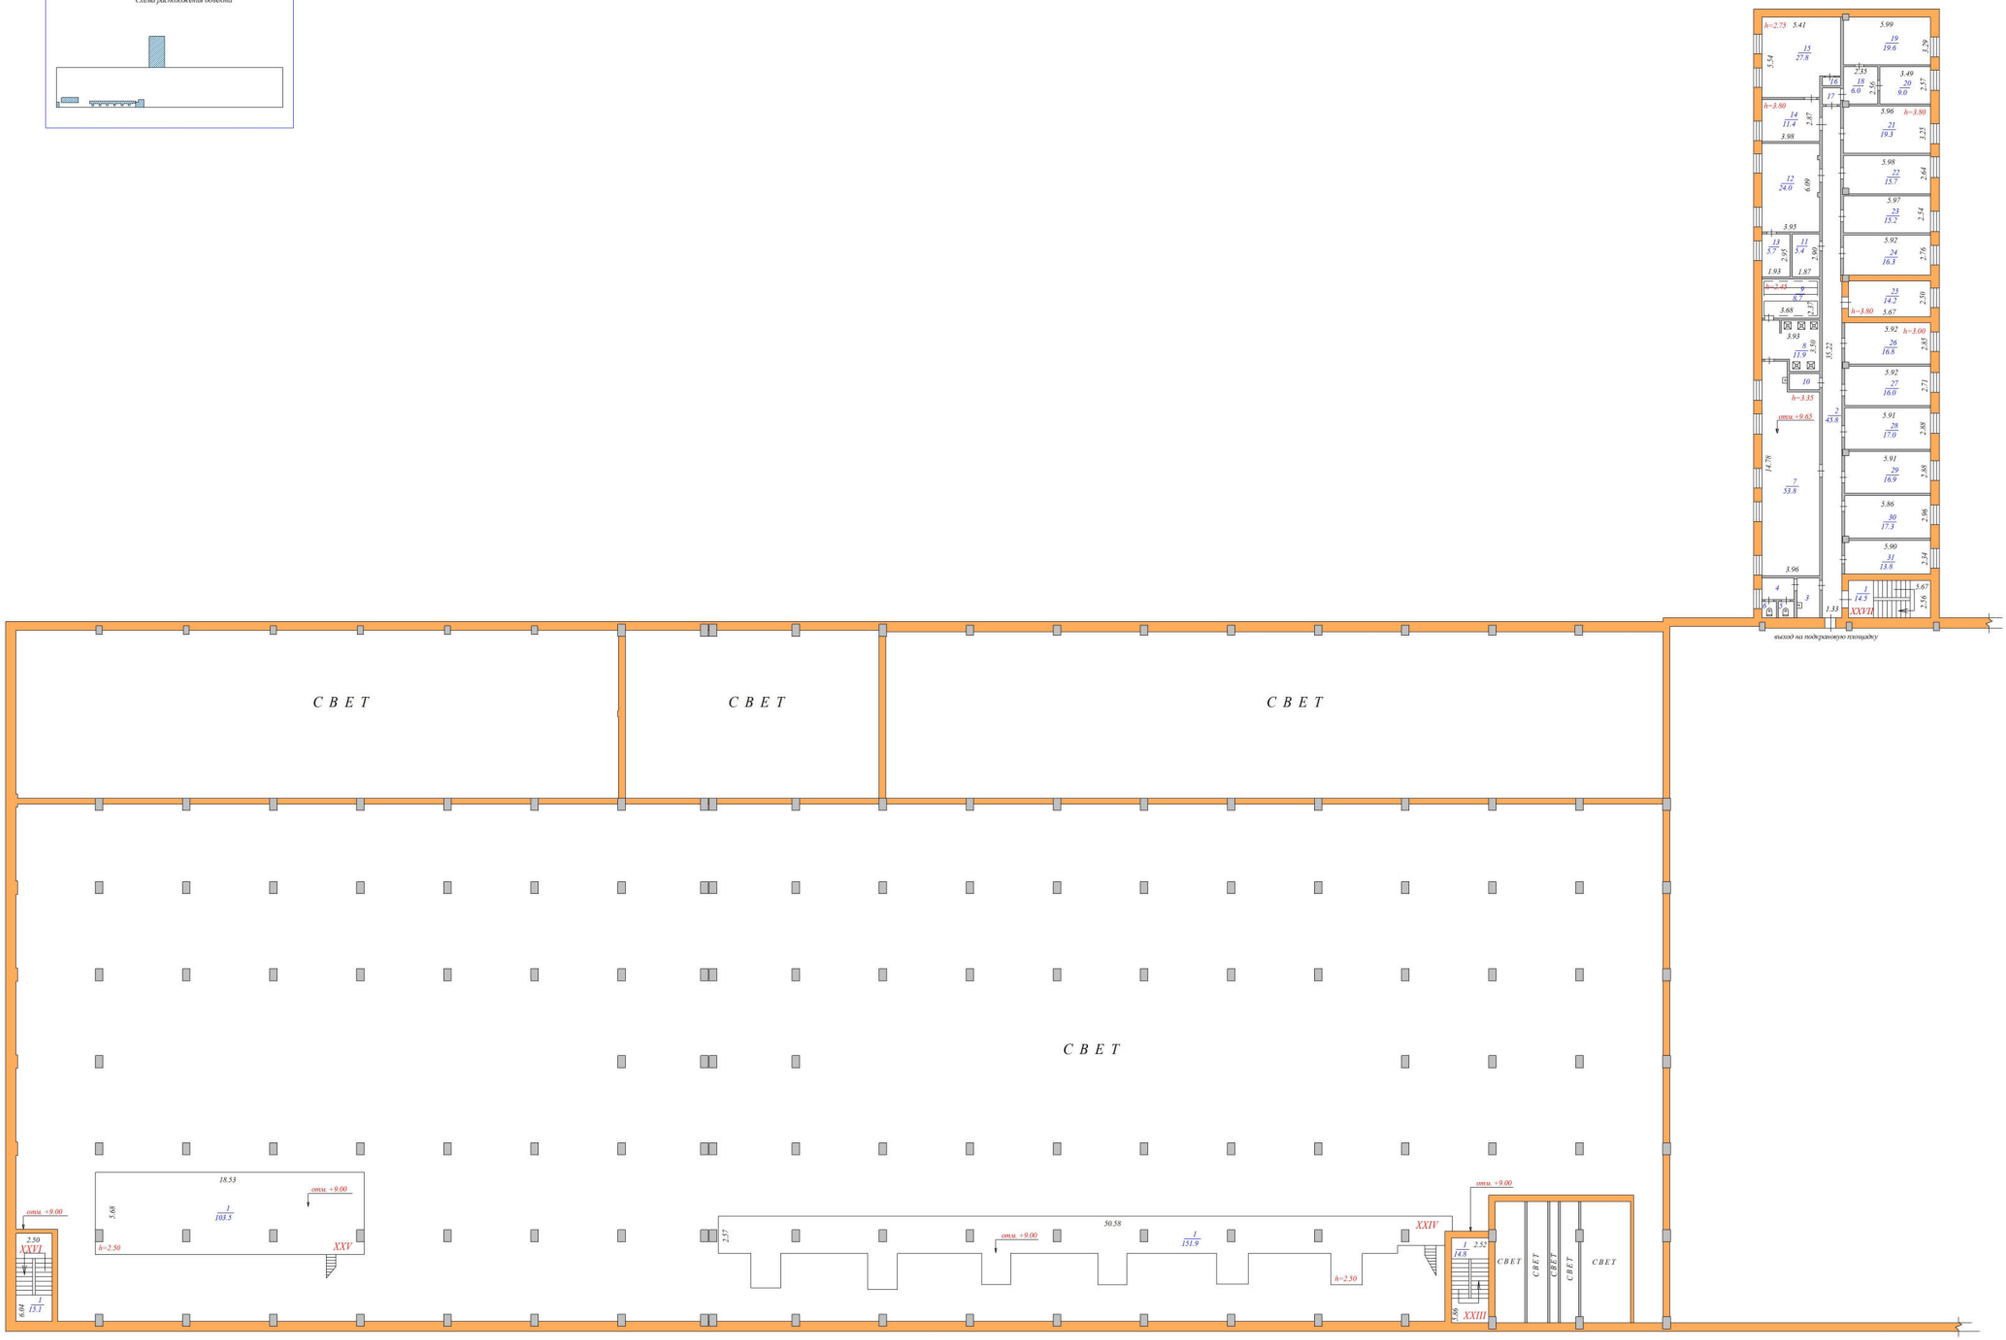

С В Е Т
С В Е Т
С В Е Т

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Поэтажный план

План 4 этажа

Схема расположения объекта

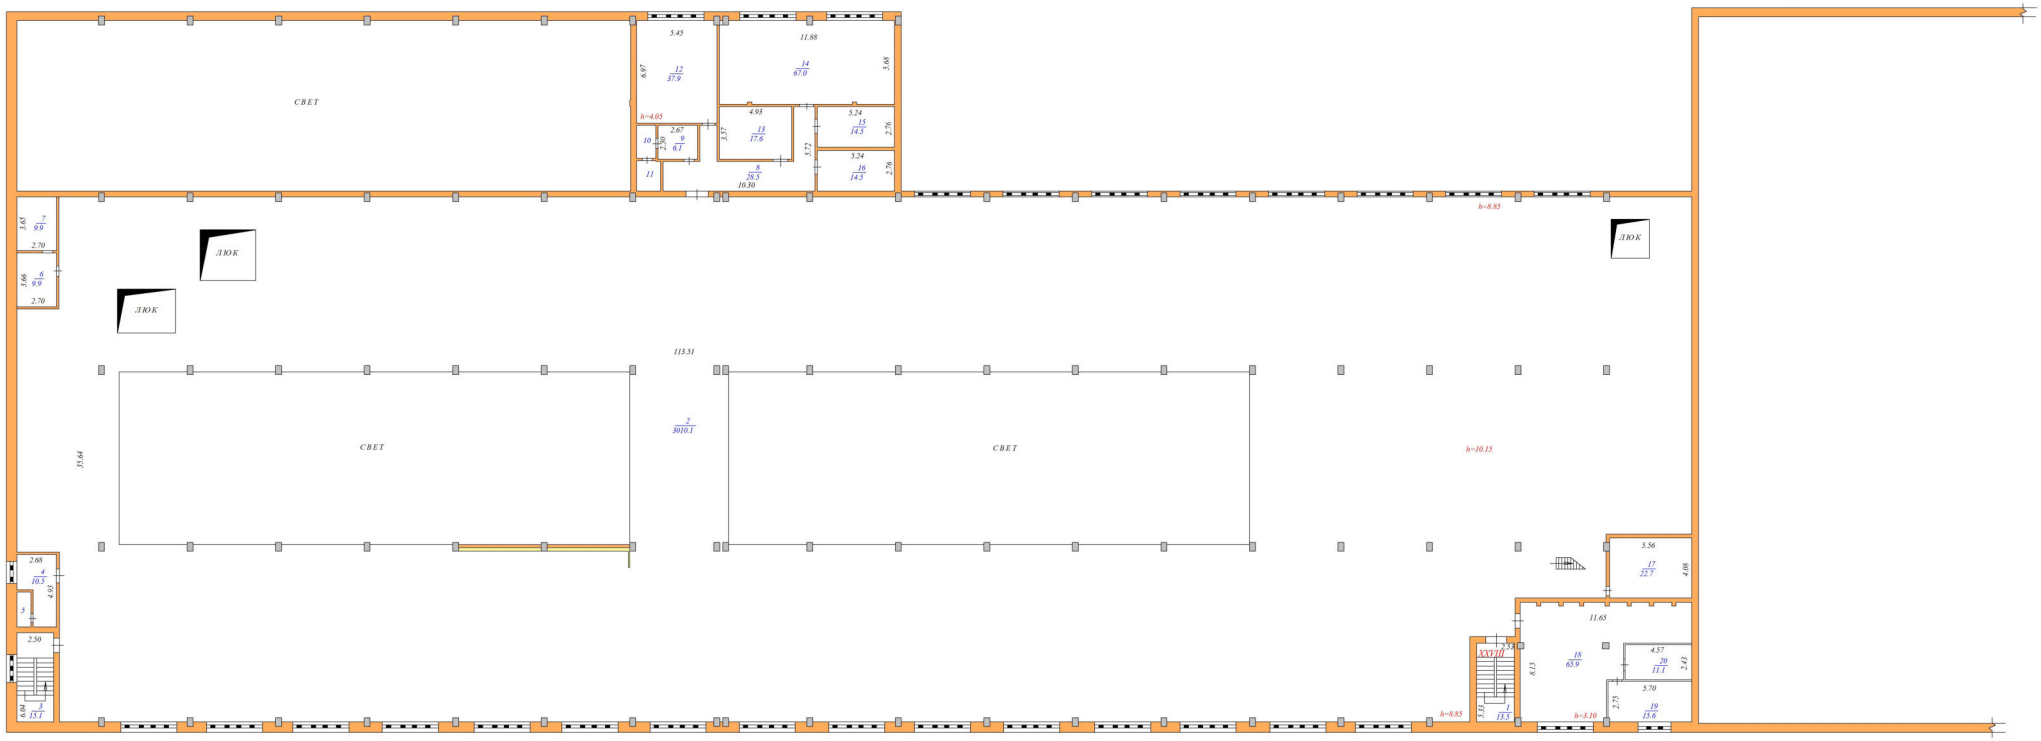


Масштаб 1:200


Составил	Обнорская Н.Г.
	18.09.2018г.
Проверил	Каменская Т.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Поэтажный план

План на отметках +15.05

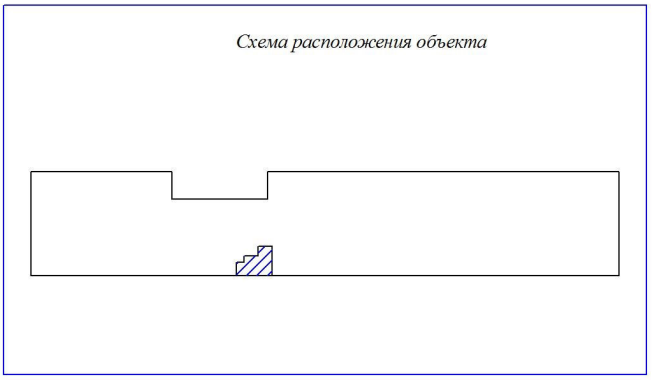

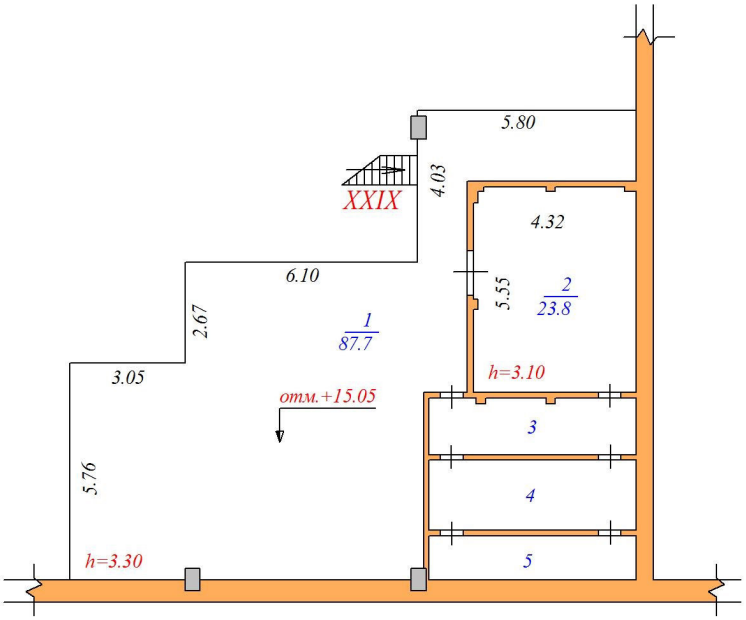

Масштаб 1:200

Составил	*Обнорская Н.Г.*
	18.09.2018г.
Проверил	*Каменская Т.А.*

Экспликация.

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) **Мончегорск**

по улице (переулку) **территория Промплощадка КГМК**

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						производственное			
						общая полезная	основная	вспомога-тельная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лит.Б 18.09.2018г.	1	I	1	Тамбур				5.1	2.50
			2	Лестничная клетка				14.8	
			3	Помещение ГМО			3828.9		5.20 12.05
			4	Подсобное помещение				39.0	
			5	Вентиляционная			68.2		
			6	Венткамера				9.5	
			7	Венткамера				4.8	
			8	Венткамера				31.8	
			9	Венткамера				10.3	
			10	Венткамера				4.7	
			11	Венткамера				28.5	
			12	РП-9			98.7		4.20
			13	Вентиляционная			70.3		5.20
			14	Венткамера				8.6	
			15	Венткамера				4.9	
			16	Венткамера				10.7	
			17	Венткамера				17.5	
			18	Венткамера				9.8	
			19	Венткамера				4.7	
			20	Венткамера				10.0	
			21	Венткамера				21.4	
			22	Тамбур				6.0	
			23	Лестничная клетка				15.2	
			24	РП-8				14.8	2.85
			25	Вентиляционная			27.6		5.25
			26	Венткамера				7.9	
			27	Венткамера				7.4	
			28	Венткамера				5.2	
			29	РП-3			14.3		
			30	Автоклавная			62.4		
			31	Автоклавная			62.9		5.15
			32	Автоклавная			23.0		
			33	РП-3а			22.3		
			34	Склад			16.5		
			35	Электроподстанция			112.5		5.25
			36	Коридор				18.4	
			37	Склад			23.6		
			38	РП-4			33.5		
			39	Подсобное помещение				121.5	5.55
			40	Подсобное помещение				12.0	
			41	Подсобное помещение				15.1	
			42	Шламовый передел			89.8		5.15
			43	Шламовый передел			17.8		
			44	Шламовый передел			258.4		5.15
			45	Коридор				68.3	
			46	Тамбур				41.4	
			47	Коридор				13.4	2.90
			48	Коридор				16.7	
			49	Комната отдыха			16.1		
			50	Комната отдыха			15.6		
			51	Швейный цех			168.8		
			52	Подсобное помещение				18.5	
			53	Коридор				10.0	
			54	Подсобное помещение				10.1	
			55	Коридор				9.2	

Экспликация.

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) **Мончегорск**

по улице (переулку) **территория Промплощадка КГМК**

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						производственное			
						общая полезная	основная	вспомога-тельная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лит.Б 18.09.2018г.	1	I	56	Коридор				5.3	
			57	Кабинет			53.2		
			58	Коридор				4.4	
			59	Подсобное помещение				10.3	
			60	Коридор				3.4	
			61	Кабинет			27.5		
			62	Коридор				7.9	
			63	Кабинет			8.7		
			64	Подсобное помещение				5.1	
			65	Побсобное пемещение				11.7	
			66	Тамбур				2.9	
			67	Лестничная клетка				14.6	
			68	Коридор				44.8	5.15
			69	Вентиляционная			83.3		
			70	Венткамера				12.4	
			71	Венткамера				5.2	
			72	Венткамера				24.0	
			73	Венткамера				9.3	
			74	Венткамера				3.9	
			75	Венткамера				18.0	
			76	Ванное отделение			5941.8		4.70
			77	Подсобное помещение				90.4	5.25
			78	Подсобное помещение				15.6	
			79	Вентиляционная			198.8		5.20
			80	Венткамера				11.3	
			81	Венткамера				7.3	
			82	Венткамера				18.6	
			83	Венткамера				11.4	
			84	Венткамера				7.5	
			85	Венткамера				18.6	
			86	Венткамера				11.3	
			87	Венткамера				7.6	
			88	Венткамера				18.5	
			89	Венткамера				70.3	
			90	Венткамера				51.5	
			91	Венткамера				8.7	3.05
			92	Венткамера				11.3	5.15
			93	Венткамера				7.6	
			94	Венткамера				18.7	
			95	Венткамера				11.2	5.15
			96	Венткамера				7.5	
			97	Венткамера				18.7	
			98	Венткамера				11.5	
			99	Венткамера				7.4	
			100	Венткамера				18.8	
			101	Подстанция-14б			70.3		
			102	Вентиляционная			140.5		
			103	Венткамера				13.1	
			104	Венткамера				5.6	
			105	Венткамера				73.0	5.05
			106	Венткамера				5.7	5.15
			107	Венткамера				12.9	
			108	Венткамера				13.2	
			109	Венткамера				5.7	
			110	Склад			23.3		2.55
			111	РП-7			26.1		3.90

Экспликация.

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) **Мончегорск**

по улице (переулку) **территория Промплощадка КГМК**

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						производственное			
						общая полезная	основная	вспомога-тельная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лит.Б 18.09.2018г.	1	I	112	Склад			6.1		
			113	Мастерская			80.7		5.15
			114	Мастерская			30.0		
			115	Мастерская			32.9		
			116	Мастерская			11.5		
			117	Мастерская			53.1		
			118	Мастерская			33.4		2.30
			119	Мастерская			15.7		
					Итого по пом.№I:	**13289.0**	**11868.1**	**1420.9**	
		II	1	Трансформаторная подстанция			12.0		4.40
					Итого по пом.№II:	**12.0**	**12.0**		
		III	1	Трансформаторная подстанция			12.1		
					Итого по пом.№III:	**12.1**	**12.1**		
		I V	1	Трансформаторная подстанция			12.1		
					Итого по пом.№IV:	**12.1**	**12.1**		
		V	1	Трансформаторная подстанция			12.0		
					Итого по пом.№V:	**12.0**	**12.0**		
		VI	1	ЭПР-1			63.1		4.95
					Итого по пом.№VI:	**63.1**	**63.1**		
		VII	1	ЭПР-2			65.5		
					Итого по пом.№VII:	**65.5**	**65.5**		
		VIII	1	Тамбур				3.0	2.90
					Итого по пом.№VIII:	**3.0**		**3.0**	
		IX	1	Подсобное помещение				24.2	5.25
					Итого по пом.№IX:	**24.2**		**24.2**	
		X	1	Трансформаторная подстанция			35.4		4.70
					Итого по пом.№X:	**35.4**	**35.4**		
		XI	1	Склад			20.4		3.05
			2	Склад			31.8		
					Итого по пом.№XI:	**52.2**	**52.2**		

Экспликация.

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) **Мончегорск**

по улице (переулку) **территория Промплощадка КГМК**

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						производственное			
						общая полезная	основная	вспомога-тельная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лит.Б 18.09.2018г.	1	XII	1	Склад			56.1		3.05
					Итого по пом.№XII:	**56.1**	**56.1**		
		XIII	1	Склад			57.5		3.15
			2	Склад			14.9		
					Итого по пом.№XIII:	**72.4**	**72.4**		
		XIV	1	Склад			29.9		
					Итого по пом.№XIV:	**29.9**	**29.9**		
		XV	1	Склад			18.7		3.05
					Итого по пом.№XV:	**18.7**	**18.7**		
		XVI	1	Склад			32.0		3.05
					Итого по пом.№XVI:	**32.0**	**32.0**		
					Итого по 1 этажу:	**13789.7**	**12341.6**	**1448.1**	
	отм. +2.40	XVII	1	Производственная площадка			26.6		2.75
					Итого по отм. +2.40:	**26.6**	**26.6**		
									3.00
	отм. +3.15	XVIII	1	Лестничная клетка				14.6	
			2	Коридор				27.3	
			3	Подсобное помещение				5.2	
			4	Подсобное помещение				4.7	
			5	Кабинет			8.9		
			6	Кабинет			8.5		
			7	Кладовая				1.6	
			8	Кладовая				1.4	
			9	Мастерская			100.5		
			10	Мастерская			22.8		
			11	Мастерская			26.2		
			12	Коридор				4.3	
			13	Мастерская			28.6		
			14	Мастерская			8.3		
			15	Коридор				5.6	
			16	Класс			76.7		2.90
			17	Комната отдыха			9.0		3.00
					Итого по пом.№XVIII:	**354.2**	**289.5**	**64.7**	
		XIX	1	Лестничная клетка				14.4	
			2	Подсобное помещение				4.0	
					Итого по пом.№XIX:	**18.4**		**18.4**	
					Итого по отметке +3.15:	**372.6**	**289.5**	**83.1**	

Экспликация.

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) **Мончегорск**

по улице (переулку) **территория Промплощадка КГМК**

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						производственное			
						общая полезная	основная	вспомога-тельная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лит.Б 18.09.2018г.	отм. +4.20	XX	1	Лестничная клетка				14.8	
					Итого по пом.№XX:	**14.8**		**14.8**	
		XXI	1	Лестничная клетка				15.1	
					Итого по пом.№XXI:	**15.1**		**15.1**	
					Итого по отм.+4.20:	**29.9**		**29.9**	
	2	XXII	1	Лестничная клетка				14.8	3.00
			2	Помещение ГМО			3041.8		6.00
			3	Подсобное помещение				28.3	3.50
			4	РП9			69.5		
			5	Лестничная клетка				15.1	3.00
			6	Подсобное помещение				13.5	6.00
			7	Автоклавная			484.0		10.70
			8	Подсобное помещение				16.4	2.90
			9	Коридор				7.3	3.95
			10	Подсобное помещение				14.6	
			11	Пульт АУ			124.9		
			12	Подсобное помещение				46.0	
			13	Ванное отделение			7715.0		15.65 16.45 16.65
			14	Кабинет			35.9		3.05
			15	Галерея			305.9		3.30
			16	Комната отдыха			9.7		
			17	Подсобное помещение				4.0	
			18	Коридор				4.8	
			19	Туалет				1.6	
			20	Туалет				1.6	
			21	Комната отдыха			9.6		
			22	Лестничная клетка				14.6	
			23	Коридор				5.5	
			24	Коридор				10.2	
			25	Комната отдыха			11.1		
			26	Душевая				4.6	
			27	Сауна			2.8		
			28	Комната отдыха			11.5		
			29	Коридор				29.5	
			30	ПУ - 32			8.8		
			31	Коридор				2.9	
			32	Коридор				3.0	
			33	Сушилка				2.3	
			34	Душевая				22.0	
			35	Сушилка				1.2	
			36	Сауна				8.4	
			37	Подсобное помещение				8.7	
			38	Душевая				28.6	
			39	Коридор				3.2	
			40	Раздевалка				106.2	3.00

Экспликация.

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) **Мончегорск**

по улице (переулку) **территория Промплощадка КГМК**

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						производственное			
						общая полезная	основная	вспомога-тельная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лит.Б 18.09.2018г.	2	XXII	41	Кабинет			16.7		3.30
			42	Раздевалка				51.2	2.85
			43	Лестничная клетка				14.5	3.30
			44	Раздевалка				15.0	
			45	Кабинет			18.5		
			46	Кабинет			14.5		
			47	Комната отдыха			11.4		
			48	Склад			21.1		
			49	Коридор				8.9	2.90
			50	Кабинет			24.2		
			51	Коридор				5.0	
			52	Подсобное помещение				17.6	
			53	Подсобное помещение				9.3	
			54	Коридор				31.2	6.00
			55	Галерея				32.6	
			56	Вентиляционная				27.5	
			57	Венткамера				10.6	
			58	Венткамера				4.6	
			59	Венткамера				11.6	
			60	Венткамера				16.4	
					Итого по 2 этажу:	**12611.8**	**11936.9**	**674.9**	
	отм. +9.00	XXIII	1	Лестничная клетка	5.86*2.52			14.8	3.00
					Итого по пом.№XXIII:	**14.8**		**14.8**	
		XXIV	1	Производственная площадка				151.9	2.50
					Итого по пом.№XXVI:	**151.9**		**151.9**	
		XXV	1	Производственная площадка				103.5	
					Итого по пом.№XXV:	**103.5**		**103.5**	
		XXVI	1	Лестничная клетка				15.1	3.00
					Итого по пом.№XXVI:	**15.1**		**15.1**	
					Итого по отм.+9.00:	**285.3**		**285.3**	
	3	XXVII	1	Лестничная клетка				14.5	3.60
			2	Коридор				45.8	3.30
			3	Умывальная				4.3	
			4	Коридор				3.3	
			5	Туалет				1.1	

Экспликация.

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) **Мончегорск**

по улице (переулку) **территория Промплощадка КГМК**

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						производственное			
						общая полезная	основная	вспомога-тельная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лит.Б 18.09.2018г.	3	XXVII	6	Туалет				1.1	
			7	Раздевалка				53.8	3.35
			8	Душевая				11.9	
			9	Сауна			8.7		2.45
			10	Подсобное помещение				2.3	3.35
			11	Подсобное помещение				5.4	
			12	Кабинет			24.0		3.00
			13	Подсобное помещение				5.7	3.00
			14	Кабинет			11.4		2.80
			15	Кабинет			27.8		2.75
			16	Шкаф				0.7	
			17	Коридор				1.4	3.00
			18	Коридор				6.0	
			19	Кабинет			19.6		
			20	Кабинет			9.0		
			21	Кабинет			19.3		
			22	Кабинет			15.7		
			23	Кабинет			15.2		
			24	Кабинет			16.3		
			25	Кабинет			14.2		3.80
			26	Кабинет			16.8		3.00
			27	Кабинет			16.0		
			28	Кабинет			17.0		
			29	Кабинет			16.9		
			30	Кабинет			17.3		
	3	XXVII	31	Кабинет			13.8		
					Итого по 3 этажу:	**436.3**	**279.0**	**157.3**	
	4	XXVIII	1	Лестничная клетка				13.5	3.10
			2	ГМО			3010.1		8.85 10.15
			3	Лестничная клетка				15.1	3.10
			4	Подсобное помещение				10.5	
			5	Подсобное помещение				2.4	
			6	Подсобное помещение				9.9	
			7	Подсобное помещение				9.9	
			8	Коридор				28.5	4.05
			9	Подсобное помещение				6.1	
			10	Подсобное помещение				3.2	
			11	Подсобное помещение				3.4	
			12	Серверная			37.9		
			13	Подсобное помещение				17.6	
			14	Мастерская			67.0		
			15	Лаборатория			14.5		
			16	Лаборатория			14.5		
			17	Подсобное помещение				22.7	3.10
			18	Мастерская			65.9		
			19	Комната отдыха			15.6		
			20	Подсобное помещение				11.1	
					Итого по 4 этажу:	**3379.4**	**3225.5**	**153.9**	

Экспликация.

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) **Мончегорск**

по улице (переулку) **территория Промплощадка КГМК**

Дата записи и литера по плану	Этажи (начиная с 1-го)	Номер помещения	Номер по плану строения	Назначение частей помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м.			Высота помещения по внутреннему обмеру
						производственное			
						общая полезная	основная	вспомога-тельная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лит.Б 18.09.2018г.	отм. +15.05	XXIX	1	Производственная площадка				87.7	3.30
			2	Вентиляционная			23.8		3.10
			3	Венткамера				6.2	
			4	Венткамера				10.6	
			5	Венткамера				6.5	
					Итого по отм.+15.05:	**134.8**	**23.8**	**111.0**	
					Итого по зданию:	**31066.4**	**28122.9**	**2943.5**	
					В том числе:				
					инв.№20002:	30557.8	27762.9	2794.9	
					инв.№20019:	148.6		148.6	
					инв.№25264:	261.3	261.3		
					инв.№25261:	98.7	98.7		

Всего скреплено и пронумеровано
на 23 (двадцать три) листах
Начальник технического отдела В.Н.Третьяк

