003833
21.07.00г.

КОПИЯ

СКОРОСШИВАТЕЛЬ

ДЕЛО №

Г. МОНЧЕГОРСК 7
ЗДАНИЕ ДРОБЛЕНИЯ РУДЫ И ФЛЮСОВ
ИНВ.№ 30004
АО КОМБИНАТ "СЕВЕРОНИКЕЛЬ"

год

Хранить лет

консервация

Мурманское

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Область, республика, край Мурманская

Район

Город (др. поселение) Мончегорск - 7

Округ города

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

НА ЗДАНИЕ дробления флюсов и руды
назначение нежилого строения

№ _____ **по улице (пер.)** _____ **(Лит.** А **)**
(местоположение объекта учета)

Инвентарный номер	1225					
Кадастровый номер						
	А	Б	В	Г	Д	Е

Паспорт составлен по состоянию на " 28 " мая 1999 г.
(указывается дата обследования объекта учета)

I. Регистрация права собственности

(реестровый № 1-248)

Смешанный Российский без Фонд иностранного владения

Дата записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности с указанием кем, когда и за каким номером выданы	Долевое участие при общей собственности	Подпись лица, свидетельствующего правильность записи
16.06.99	АО комбинат „Североникель"		1	
14.04.2000	ОАО, Кольская горно-металлургическая компания	Договор купли-продажи от 16.09.99 Свидетельство о государственной регистрации права собственности Федеральная регистрационная служба по Мурманской области № 039084 от 22.12.99г.	1	

II. Эксплуатация земельного участка, кв. м

Площадь участка			Незастроенная площадь				
по документам	фактически	застроенная	замощенная	озелененная	прочая		
		432				481	

III. Благоустройство здания, кв. м

Водопровод	Канализация	Отопление: центральное	Отопление: от групповой (районной) котельной	Отопление: от собственной котельной	Отопление: от ИТП	Отопление: печное		Централизованное горячее водоснабжение	Ванны: с центральным горячим водоснабжением	Ванны: с газовыми колонками	Ванны: с дровяными колонками	Газоснабж.: центральное	Газоснабж.: жидким газом	Электроснабжение	Лифты, шт.: пассажирские	Лифты, шт.: грузовые		
		587.4												587.4				

IV. Общие сведения

Назначение: здание дробления флюсов и руды

Использование:

Количество мест (мощность):

а)

б)

в)

г)

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т. д.)

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь, кв. м	Высота, м	Объем, куб. м
1	2	3	4	5	6
А	здание дробления флюсов и руды	9.55 × 11.40 + 24.15 × 10.70	367.28	13.45	4940
		8.80 × 6.25	55.00	3.40	187
		4.96 × 3.11	15.43	2.95	46
	подвал	2.89 × 1.05 + 5.57 × 9.58 +			
		2.45 × 7.38	81.86	2.80	229
	— " —	6.57 × 2.90 − 1.52 × 0.84	19.78	3.00	53
					5455

Литера А

Группа капита

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов
1	2
1	Фундамен
2	а) Стены наружн отделк
	б) Перего
3	Перекрытия: чердач
	междуэ
	надпод
4	Крыша
5	Полы
6	Проемы: оконны
	дверны
7	Внутренняя отделка
8	Сан. и эл.-техн. устройства: отопле
	водопр
	канали
	г. водо
	ванны
	электр
	радио
	телеф
	вентил
	лифты
9	Прочие

Проц. и

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А Год постройки 1940 Число этажей 3

Группа капитальности I Вид внутренней отделки простой

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (признаки износа)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу, %	Удельный вес конструктивного элем. с поправк.	Износ, %	% износа к строению гр. 7 x гр. 8 / 100	Тек. изм. износ, % элемента	Тек. изм. износ, % к строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	Бутобетон	Глубокие трещины	30	1	30	60	18.0		
2	а) Стены и их наружная отделка	Кирпичные колонны ж/бетонные	разрушение кирпичей, трещины.	20 13	1 1	20 13	65 60	13.0 7.8		
	б) Перегородки	Кирпичные	сколы трещины.							
3	Перекрытия: чердачное	ж/бетонные плиты	Глубокие трещины	13	1	13	60	7.8		
	Перекрытия: междуэтажные	— металлические	в местах сопряжений.							
	Перекрытия: надподвальное	ж/бетонные плиты								
4	Крыша	Бесчердачная мягкая.	Разрывы, вмятины протечки.	3	1	3	65	2.0		
5	Полы	Бетонные	Стертость, выбоины, трещины.	2	1	2	65	1.3		
6	Проемы: оконные	Стеклоблоки с 2-м остеклением.	Переплеты перекошены.	3	1	3	65	2.0		
	Проемы: дверные	металлические	стекла разбиты. полотна перекошены.							
7	Внутренняя отделка	Побелка, окраска окон, дверей	окраска утеряна	2	1	2	65	1.3		
8	Сан. и электротехн. устройства: отопление	Промышл. котельн.	протечки							
	водопровод									
	канализация									
	г. водоснабж.									
	ванны									
	электроосвещ.	открытая проводка	нарушение изоляции	8	1	8	65	5.2		
	радио									
	телефон									
	вентиляция	Особо строительные работы		3	1	3	65	2.0		
	лифты									
9	Прочие работы	Прочие	Глубокие трещины	3	1	3	65	2.0		
			Итого:	100	x	100	x	62.4	x	

Проц. износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{проц. износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{62.4 \times 100}{100} = 62\%$

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	литера Н	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	литера Н	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	литера Н	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	Наименов конструкть элемен
Фундаменты													Фундаменты
Стены и перегородки													Стены и перегор
Перекрытия													Перекрытия
Крыша													Крыша
Полы													Полы
Проемы													Проемы
Отделочные работы													Отделочные рабо
Электроосвещение													Электроосвещен
Прочие работы													Прочие работы
Итого		100	x			100	x			100	x		Итого

Формулы дл площади, об

Наименование конструктивных элементов	литера Н	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	литера Н	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	литера Н	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	Наименов конструкть элемен
Фундаменты													Фундаменты
Стены и перегородки													Стены и перегор
Перекрытия													Перекрытия
Крыша													Крыша
Полы													Полы
Проемы													Проемы
Отделочные работы													Отделочные рабо
Электроосвещение													Электроосвещен
Прочие работы													Прочие работы
Итого		100	x			100	x			100	x		Итого

Формулы дл площади, об

VIII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера по плану	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэффициенты) на: удельн. вес	груп. капит.						Стоимость измерителя с поправкой	Количество, куб. м, площ., кв. м	Восстан. стоимость, руб.	Процент износа	Действит. стоимость, руб.	Литера	Наименов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	
А	Здание дра-бленая фаб-сов и рубч.			м 3		100	Балансовая ст.							5455		62	351342		

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал, конструкция	Размеры: длина, м	Размеры: высота, ширина, м	Площадь, кв. м	№ обсчика	№ таблицы	Измерители	Стоимость измерителя по таблице	Поправка на климат. район	Восстановительная стоимость, руб.	Процент износа	Действит. стоимость, руб.

XII. Общая стоимость, руб.

В ценах какого года	Основные строения: восстановительная	Основные строения: действительная	Служебные постройки: восстановительная	Служебные постройки: действительная	Сооружения: восстановительная	Сооружения: действительная	Всего: восстановительная	Всего: действительная
Балансов. 15.02.99.		351342						351342

"16" 06 19 99 г. Исполнил (Зунько. Ленко. Зунько)

"18" 06 19 99 г. Проверил (Тишин А.В.)

"___" _____ 19____ г. Начальник ГУПТИ (Комиссаров В.П.)

XIII. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	"___" _____ 19__ г.	"___" _____ 19__ г.	"___" _____ 19__ г.
Обследовал			
Проверил			
Начальник ГУПТИ			

металлургический цех

Здание дробления флюсов и руды

инв № 30004

Строение здание дробления флюсов и руды
по улице Транспортная в г. Мончегорск - 7
зарегистрировано в ГУПТИ для государственного учета
за Открытым акционерным обществом
„Кольская горно-металлургическая компания"

на основании Договора купли-продажи от 1.12.99
Свидетельства о государственной регистрации
права собственности Областного Департамента
от 22.12.99г. серия 51 № 039084
Записано в реестровую книгу № 1 реестр № 248
спр. № инвентарное дело 1225

14 июля 2000 года

Начальник:

Помощник начальника Мончегорского БТИ

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ по адресу:


Гор(пос) Мончегорск - 7

Здание дробления флюсов и руды


по улице(пер) _____ дом № _____

инв № 30004

План 1 этажа

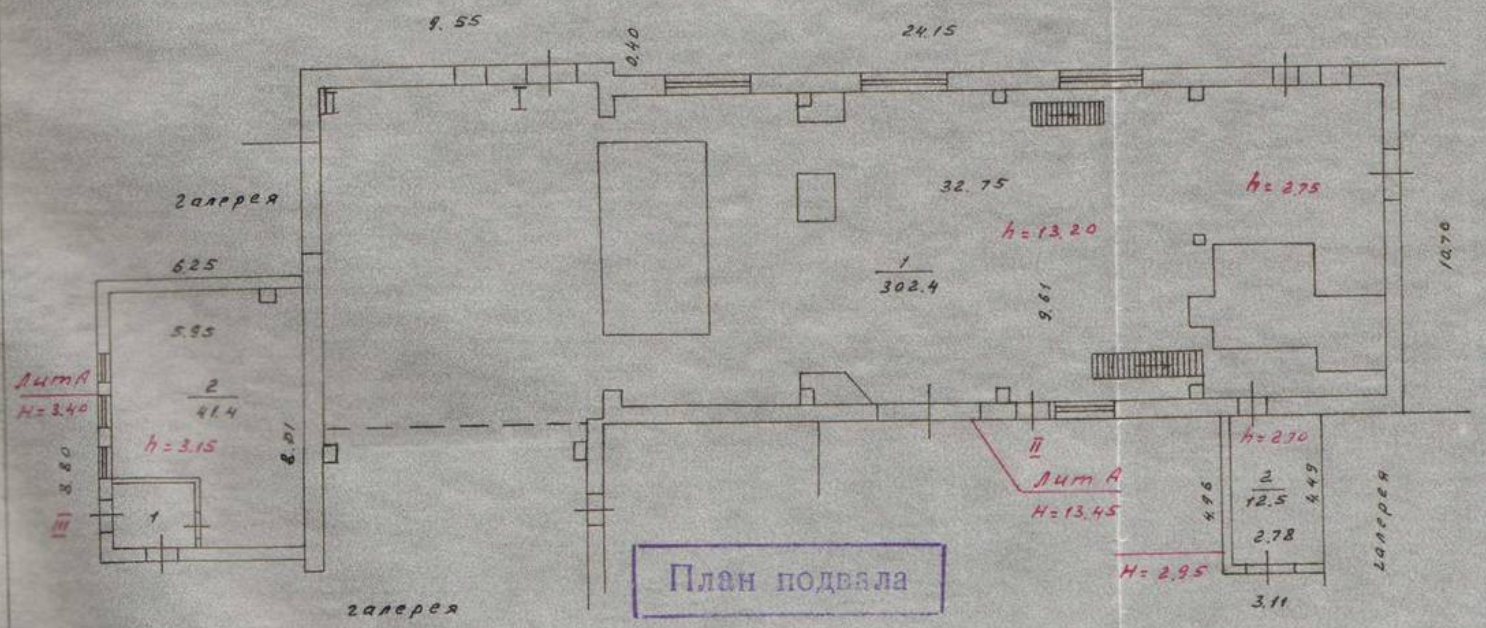

План подвала

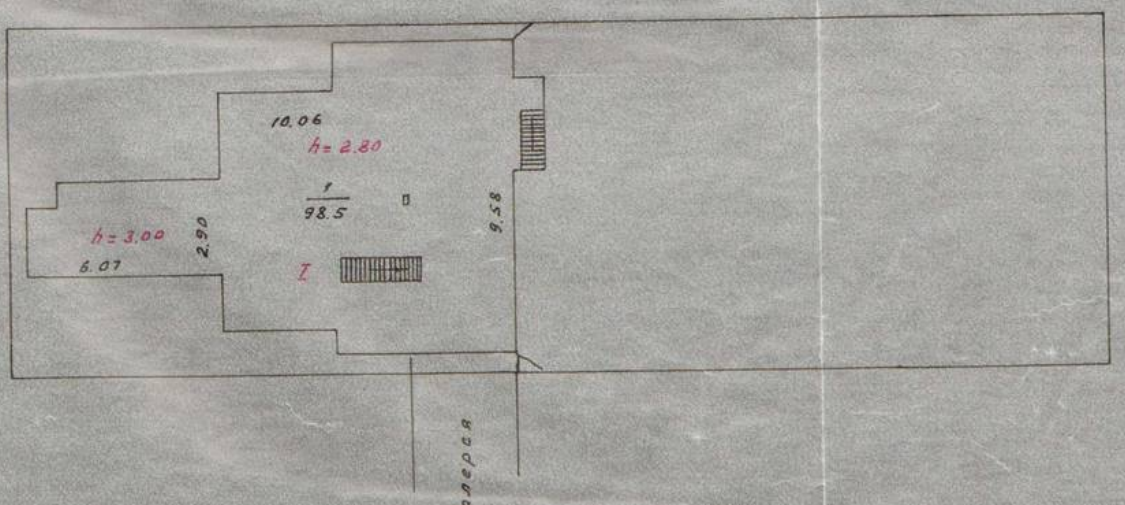


МАСШТАБ 1:200

СОСТАВИЛ Гунько.


ПО 16.05.99г.

Проверил: ИЧ

План 3 этажа

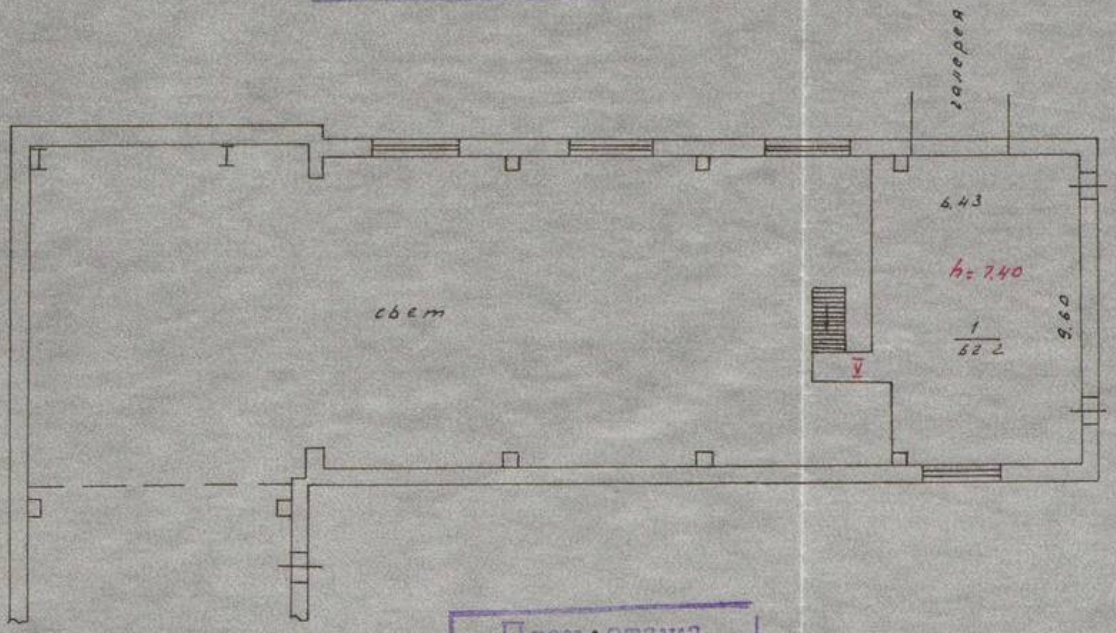

План 2 этажа

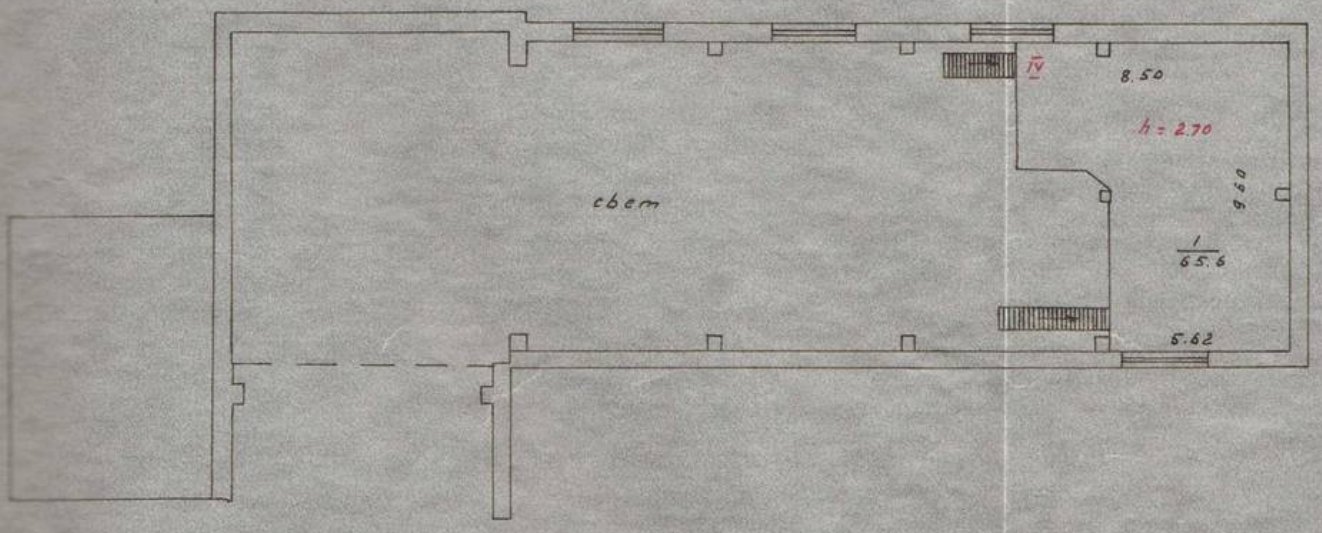

МАСШТАБ 1:200

СОСТАВИЛ [signature] Ачиско
ПО 16.06.99г.
Проверил [signature]

ЭКСПЛИКАЦИЯ 1

инв 30004

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) Минеральные Воды по улице (переулку) Строение Проблемная данных и руды

Дата записи и литера по плану	Этаж (цифрами с 1-го этажа и сначала наземного)	Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т. п.)	Номер по плану строения (комнаты, кухни, коридора и т. д.)	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, больничная палата, кухня, коридор и т. п.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру, кв. м: жилые		торговые		канцелярские		производств.								итого по квартире, этажу, строению	высота помещения по внутреннему обмеру
						основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная		
А	подвал	I	1	Производств. пом.								92.5									3.00
																					2.40
					Итого по подвалу:							92.5								92.5	
																					12.20
	I	II	1	Производств. пом.								302.4									
			2	Котельная								12.5									2.20
					Итого:							314.9								314.9	
		III	1	Тамбур									4.2								2.15
			2	Подсобное пом.									41.4								
					Итого								46.2							46.2	
					Итого по I этажу:							413.4	46.2							459.6	
	II	IV	1	Техн. площадка								65.6									2.20
					Итого по II этажу:							65.6								65.6	
	III	V	1	Техн. площадка								62.2									2.44
					Итого по III этажу:							62.2								62.2	
				Итого по Строению:								541.2	46.2							587.4	

Составил [illegible] 10.12.89

Проверил [illegible]
